
Oprava povrchu komunikace
sil. III/328 12 Choťánky - Pátek


termín: 11.5. - 14.6.2026

uzavřený úsek 2000m
objízdná trasa 12,5km pro vozidla do 12t






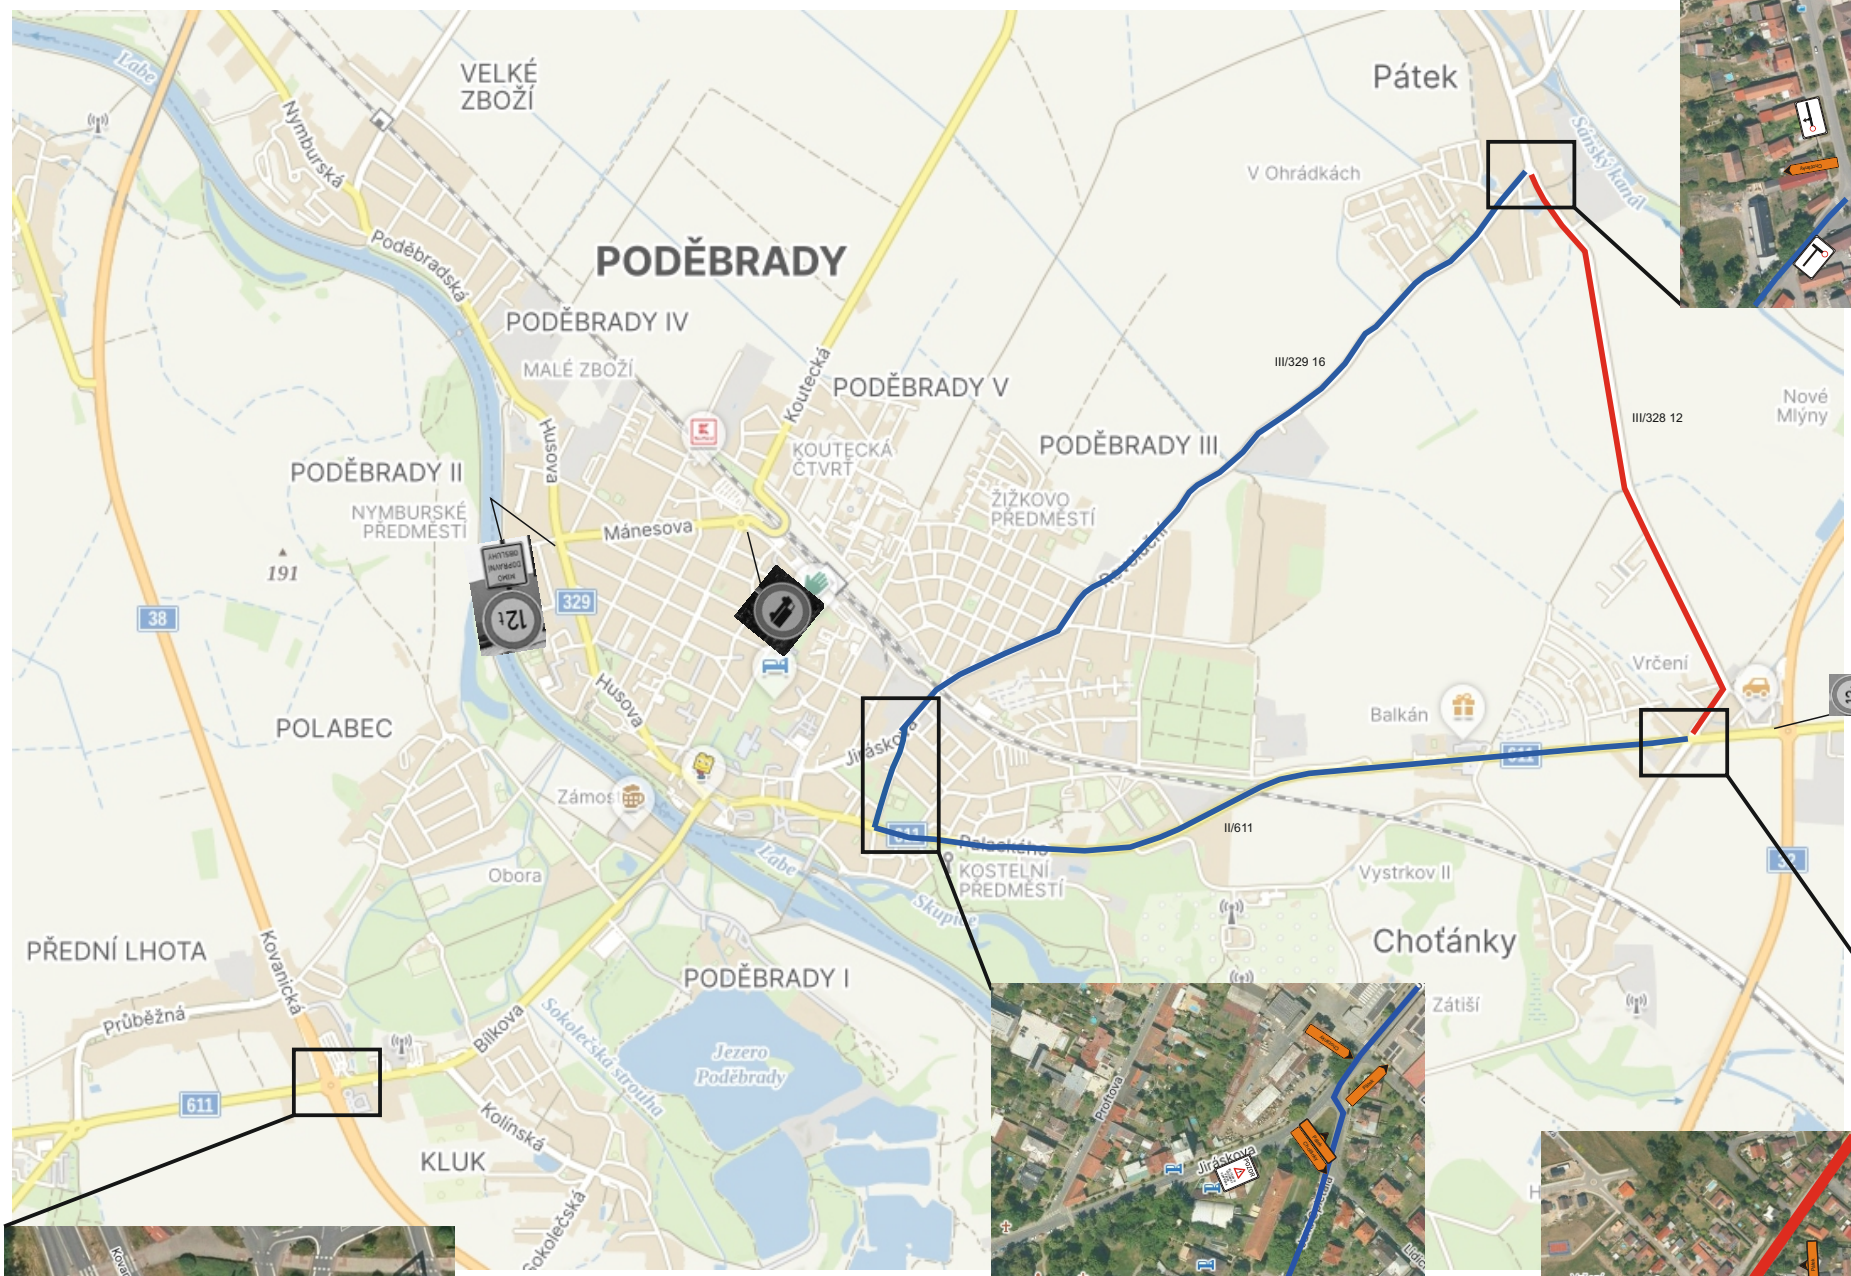

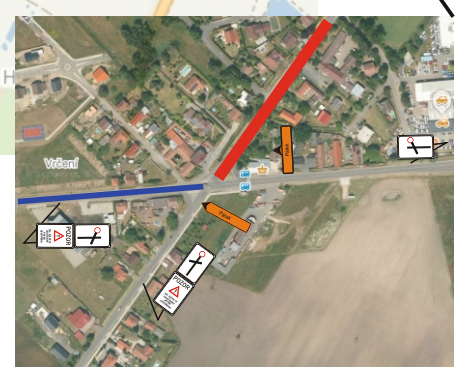

Stavební práce zahrnují: seřezání krajnic s naložením a odvozem, ,čištění příkopů strojně, odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, lokální sanace konstrukčních vrstev v intravilánu Choťánky, v celém úseku extravilánu opravy sanace v jízdních pruzích v celé délce v šíři 1,5 m a hloubce 80 mm, čištění vozovek samosběrem, sanace- ložní vrstva ACP22+ tl.80 mm, vyrovnávka ACL16+ v tl.40 mm, v extravilánu, v intravilánu ACL16+ v tl.50 mm, spojovací postřik ve všech vrstvách, pokládka ACO11+ tl.50 mm, zalití spár asfaltovou zálivkou, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl.do 100mm, provedení VDZ barva + plast - vodící pruhy + křiž. s II/611 - 12,5 cm. Součástí opravy komunikace je i oprava a vyčištění propustků dle rozpočtu.

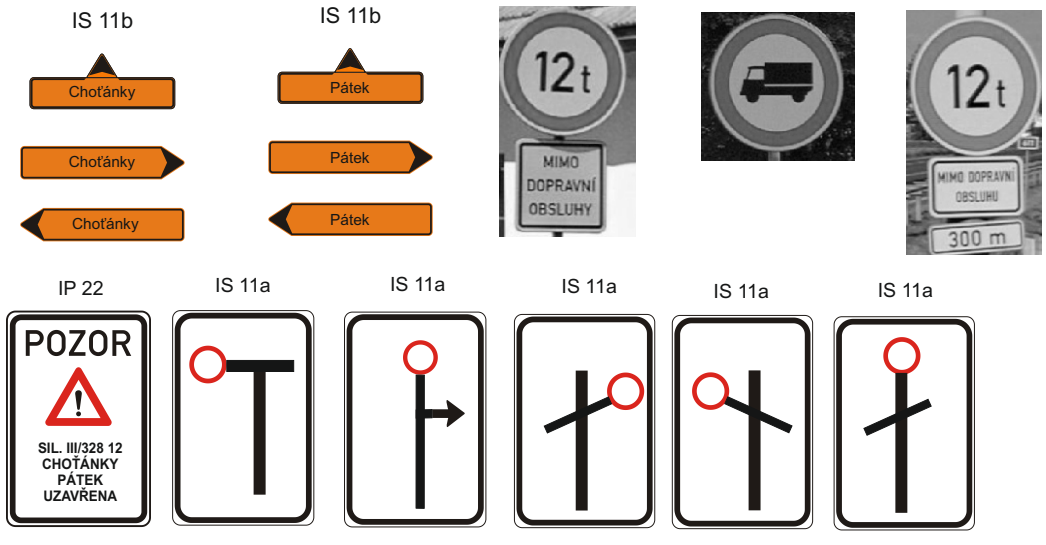

Zhotovitel: CH&T PARDUBICE

Kreslil:	Blanka Faltysová / tel.: 601 545 613	
Zodp. projektant:		
Kontroloval:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz	
Kraj: Středočeský	Okres: Nymburk	Obec: Choťánky - Pátek

DZPCE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PARDUBICE a.r.o.
Rosice 155
533 51 Pardubice
IČO: 259 31 016 DIČ: CZ25931016
tel.: 603 115 936
e-mail: info@dzpce.cz
web: www.dzpce.cz

Akce:
oprava povrchu komunikace


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

DATUM	16.04.2026
Č. STAVBY	
STUPEŇ PD	DIO
MĚŘÍTKO	
FORMÁT	6xA3

Oprava povrchu komunikace
sil. III/328 12 Choťánky - Pátek

termín: 11.5. - 14.6.2026

uzavřený úsek 2000m
objízdná trasa pro NA nad 12t 23,2km

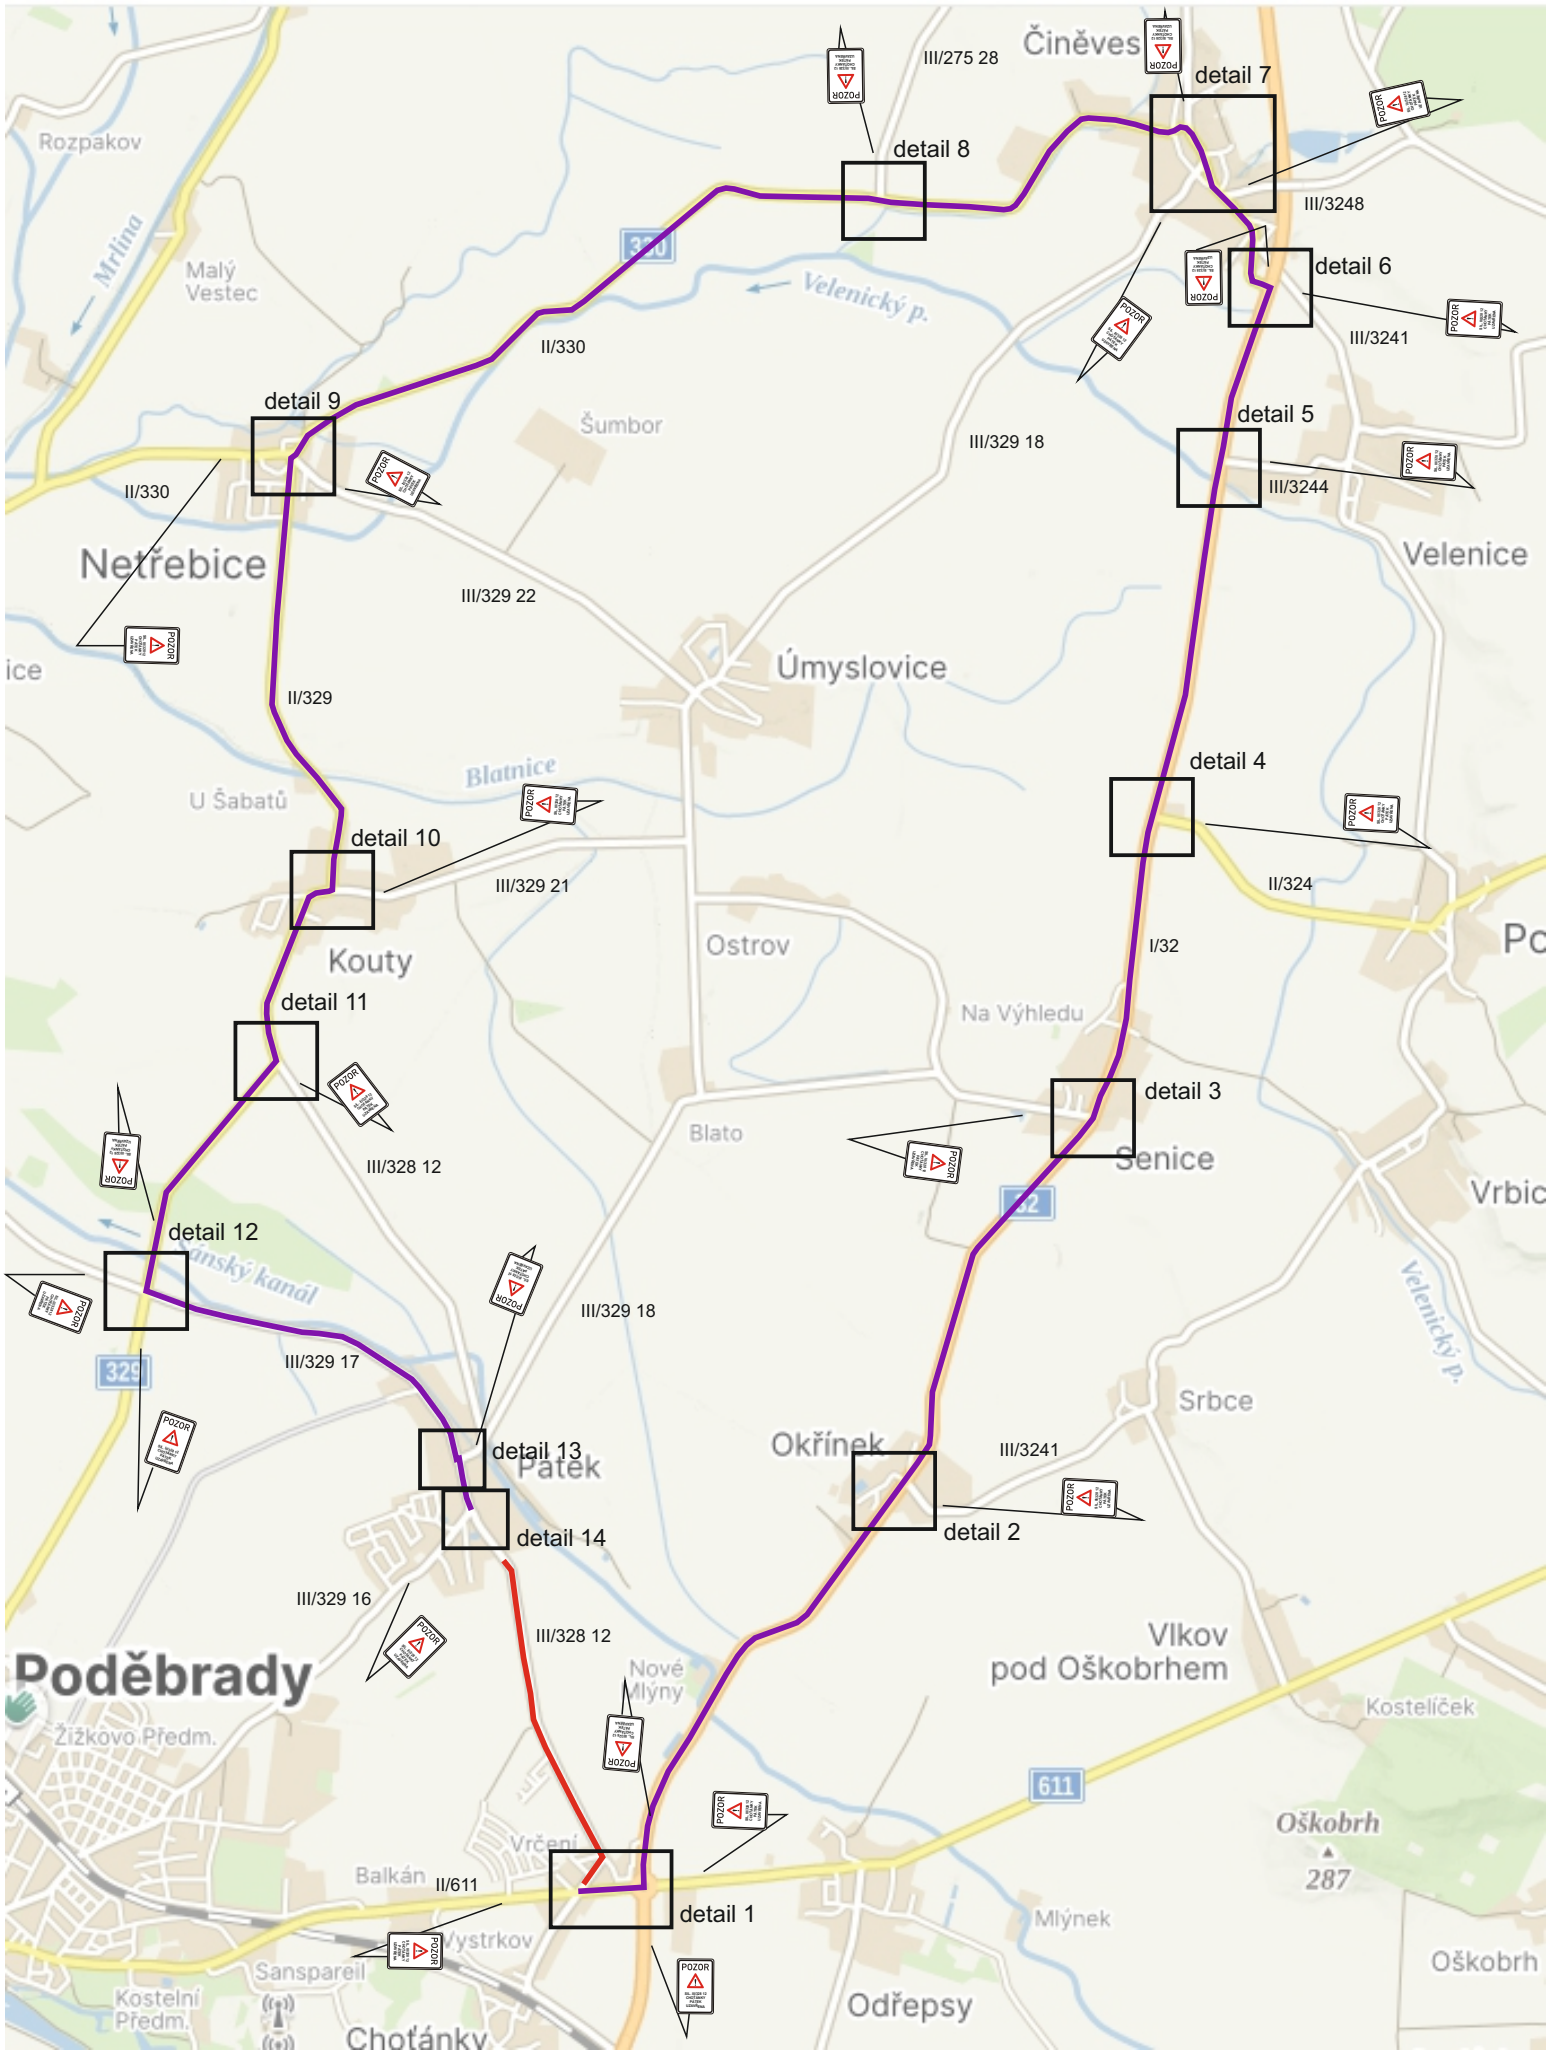

IP 22




Oprava povrchu komunikace
sil. III/328 12 Choťánky - Pátek

termín: 20.5. - 14.6.2026


detail 1




detail 2

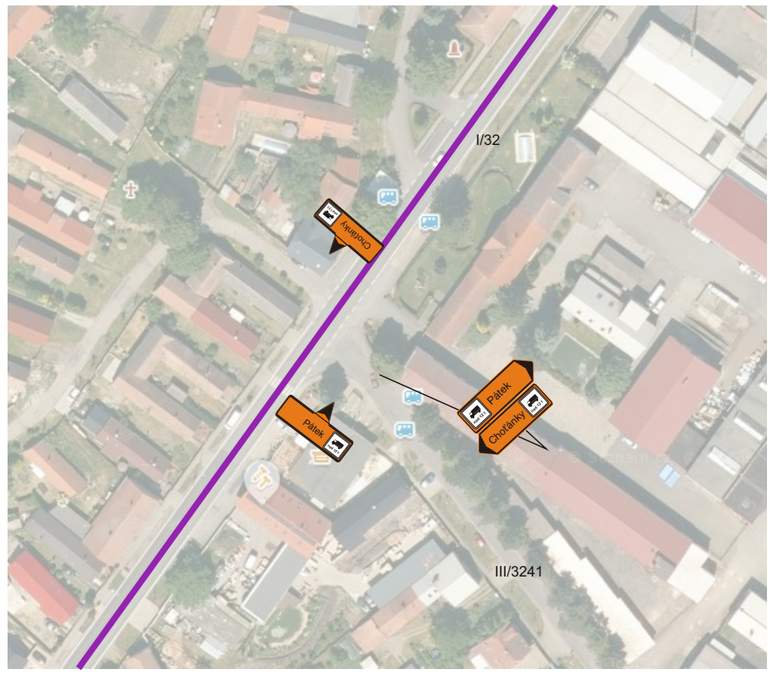

detail 3

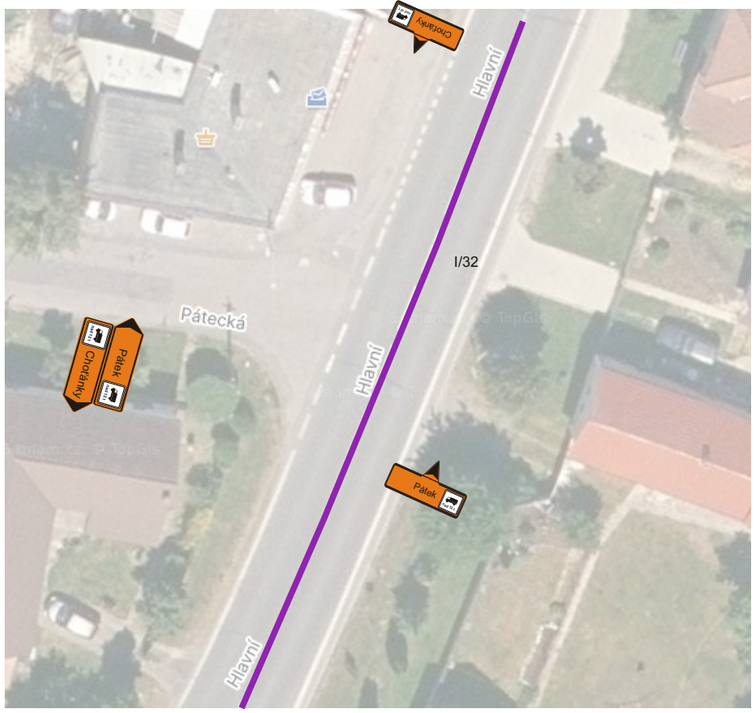


IS 11b

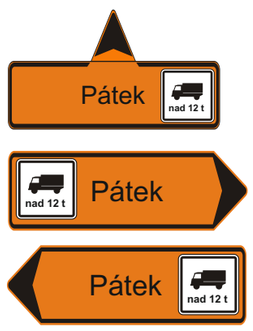

IS 11b



detail 4

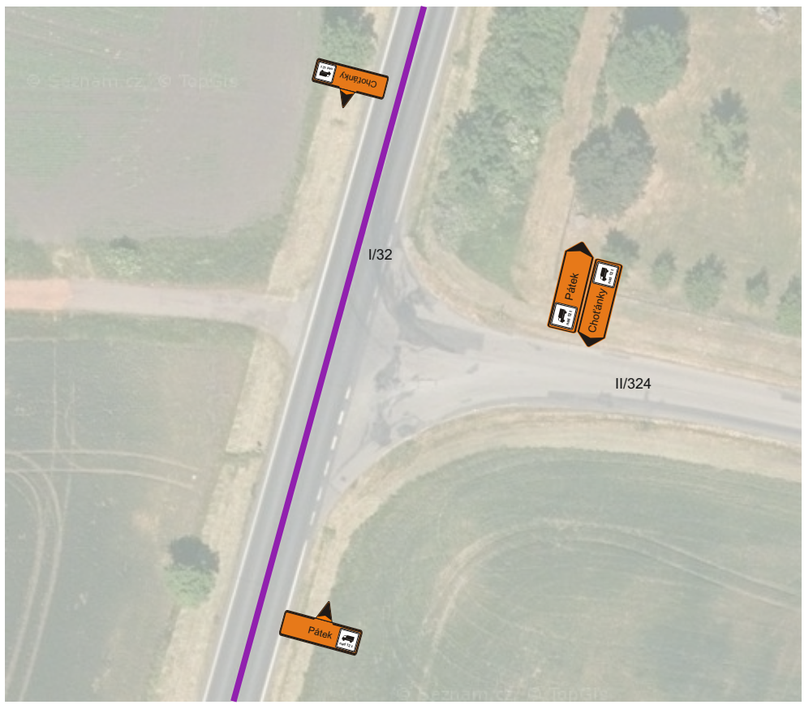

IS 11b



IS 11b





Oprava povrchu komunikace sil. III/328 12 Choťánky - Pátek


termín: 20.5. - 14.6.2026








detail 5

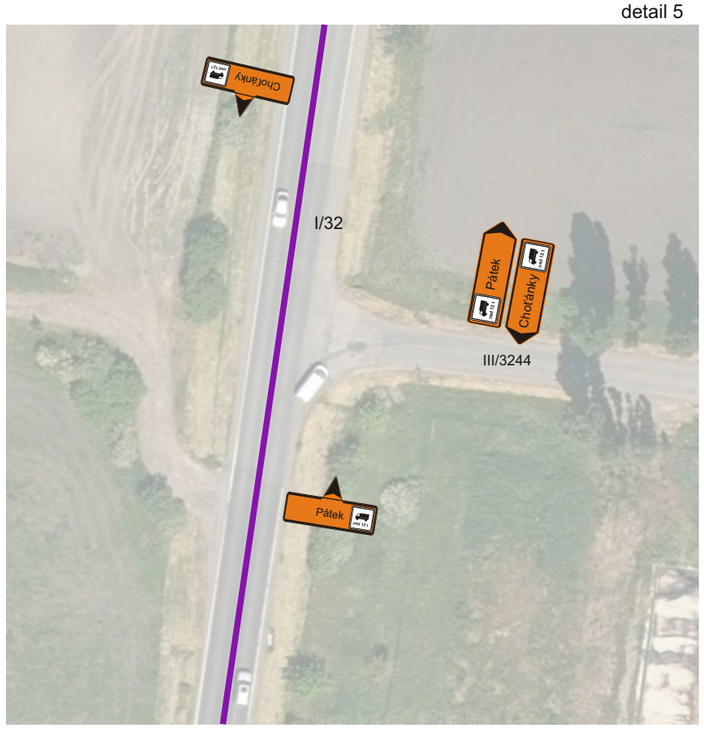

detail 6

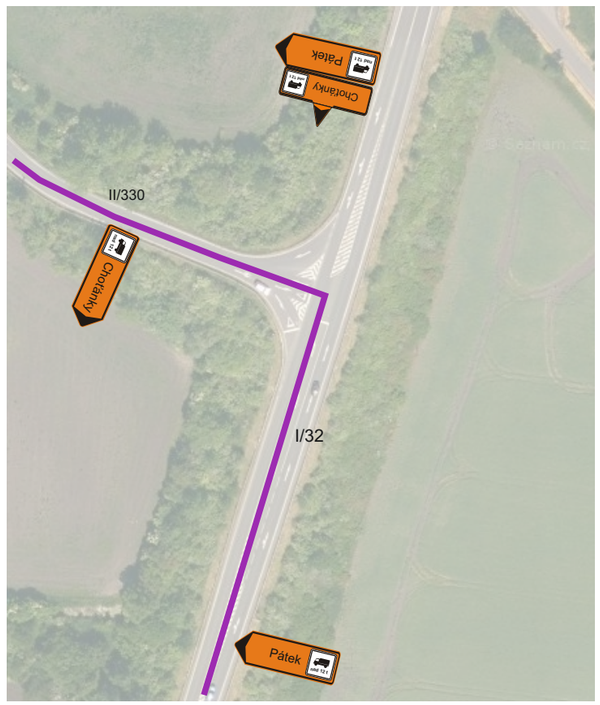


detail 7




detail 8



detail 9

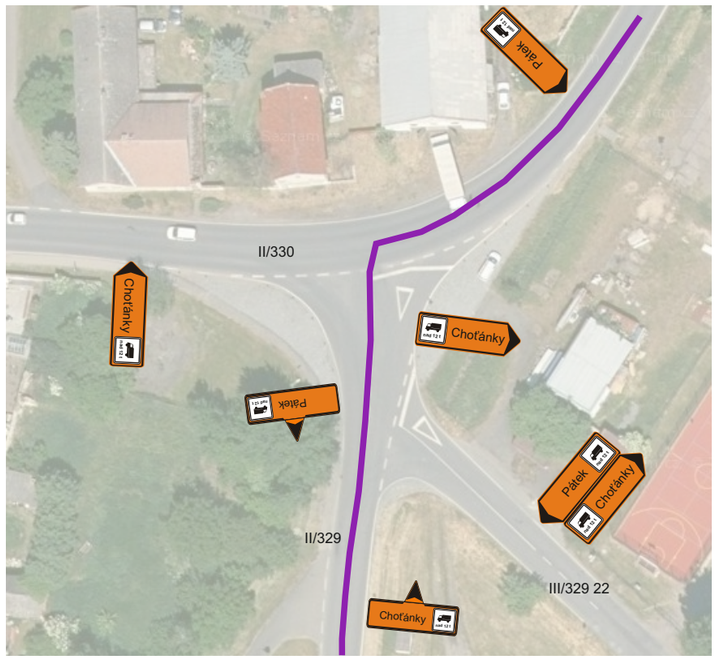


detail 10

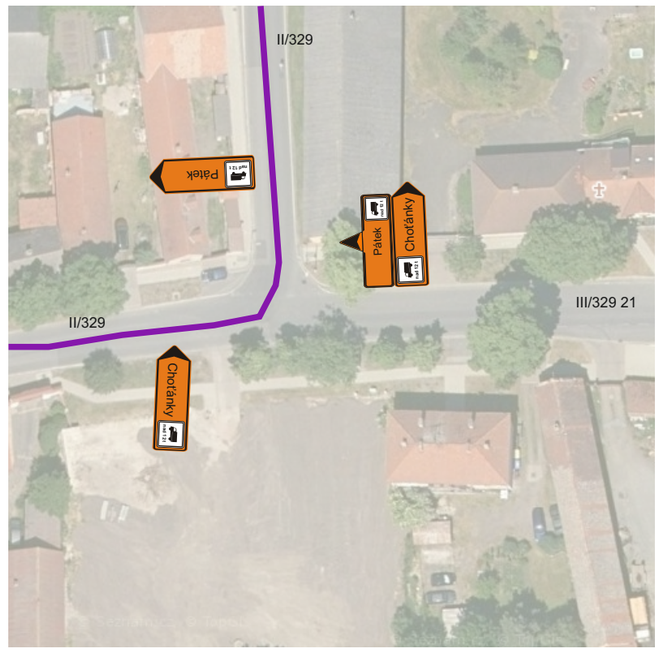


Oprava povrchu komunikace
sil. III/328 12 Choťánky - Pátek

termín: 11.5. - 14.6.2026


detail 11

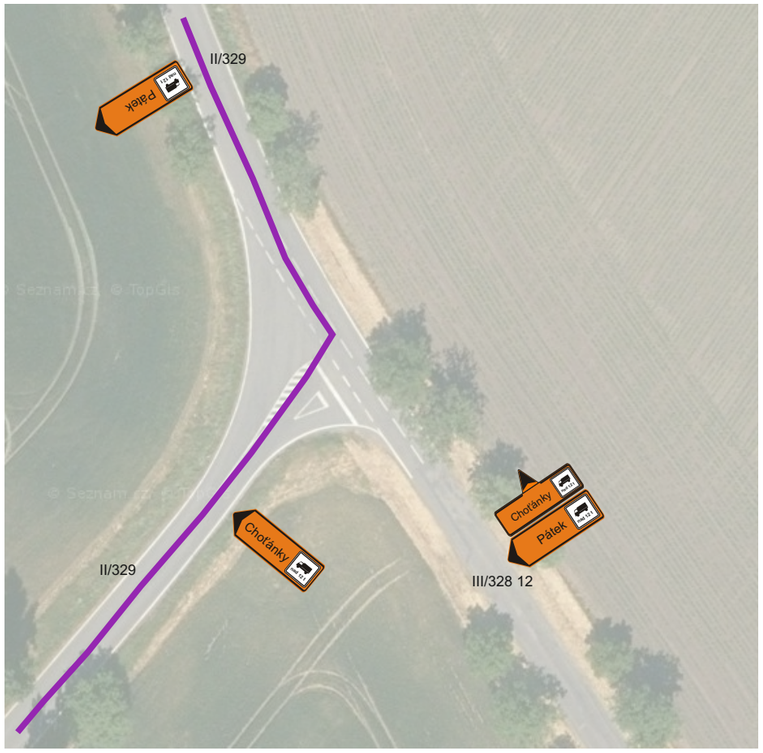


detail 12

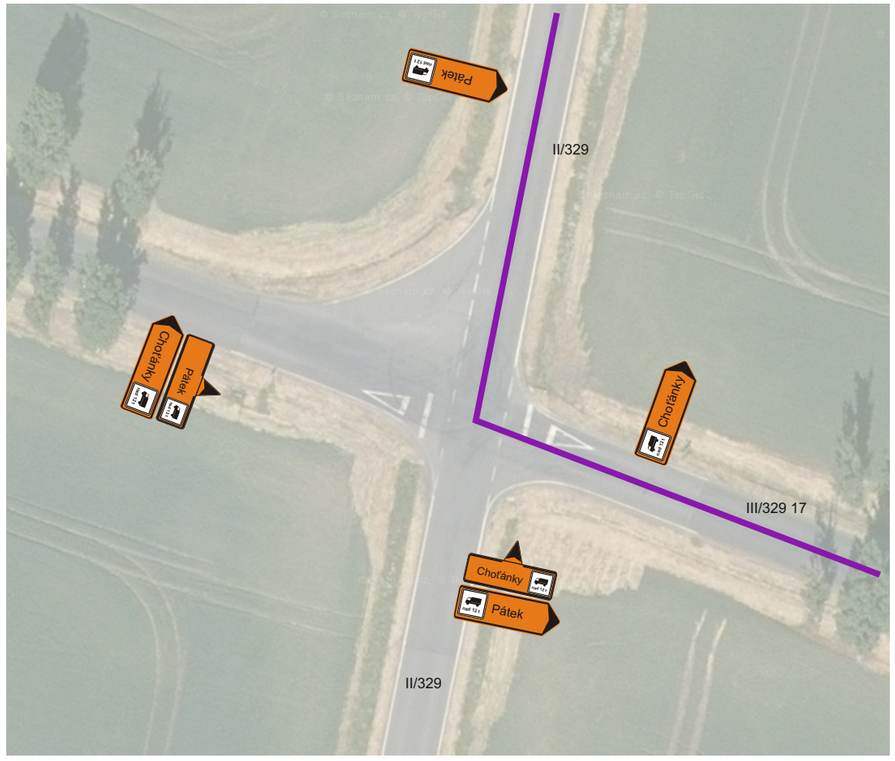


detail 13

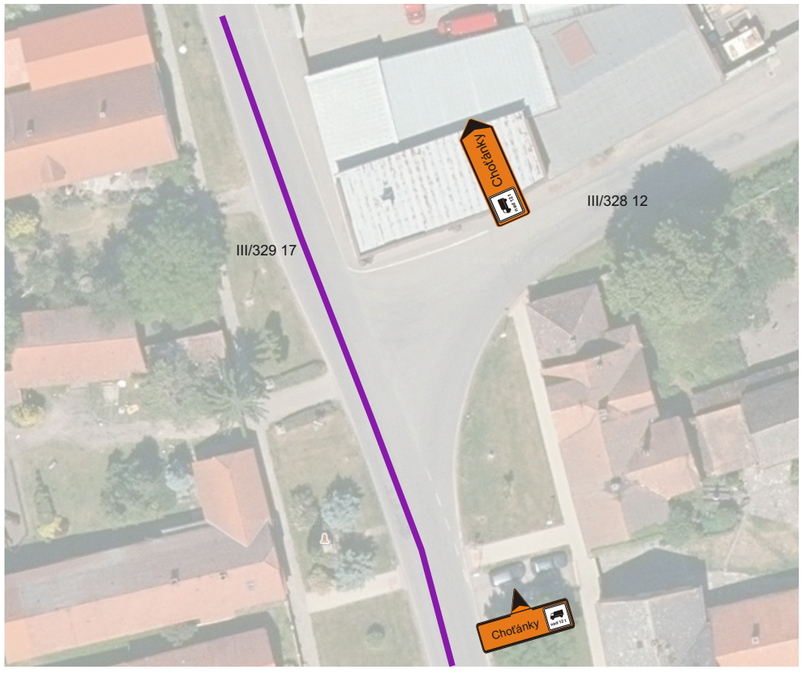


detail 14

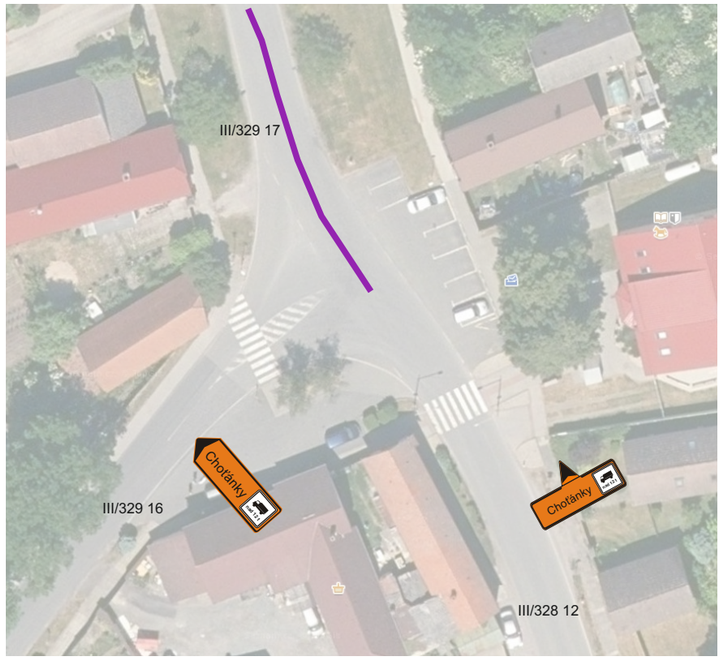

IS 11b

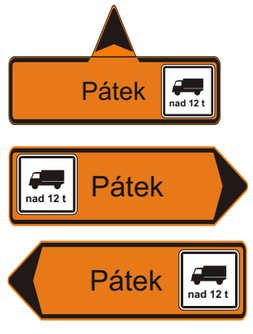

IS 11b

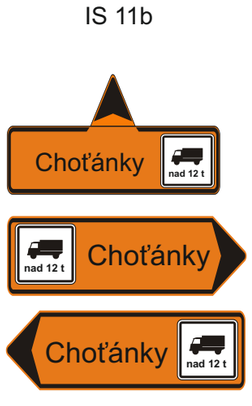

Oprava povrchu komunikace
sil. III/328 12 Choťánky - Pátek

termín: 11.5. - 14.6.2026

uzavřený úsek 300m

Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno.

Přístup k nemovitostem v koordinaci se stavbou.

Po dobu pokládky asfaltových vrstev bude umožněn vjezd pouze vozidlům stavby.

